


Projektterminplan LP 1-8 EWBau
Neubau des Hortgebäudes der Grundschule Rothensee

| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | Link Info | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|--------------|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Aug | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Jan | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LP 1 GRUNDLAGENERMITTLUNG | 92 at | Do, 12.08.21 | Fr, 17.12.21 | LP 1 GRUNDLAGENERMITTLUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Vermessung | 17 at | Do, 12.08.21 | Fr, 03.09.21 | Vermessung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Baugrundgutachten | 17 at | Do, 12.08.21 | Fr, 03.09.21 | Baugrundgutachten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Finalisierung Raumprogramm | 4 at | Do, 12.08.21 | Di, 17.08.21 | Finalisierung Raumprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Klärung Energieversorgung | 17 at | Mo, 08.11.21 | Di, 30.11.21 | Klärung Energieversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Erstellung Vermesseralageplan 1:250 | 17 at | Mo, 08.11.21 | Di, 30.11.21 | Erstellung Vermesseralageplan 1:250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Erkundung Schächte und Medien auf dem Baufeld | 30 at | Mo, 08.11.21 | Fr, 17.12.21 | Erkundung Schächte und Medien auf dem Baufeld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Schadstoffuntersuchungen Baugrund | 30 at | Mo, 08.11.21 | Fr, 17.12.21 | Schadstoffuntersuchungen Baugrund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | LP 2 VORPLANUNG (LS 1) | 63 at | Mi, 18.08.21 | Fr, 12.11.21 | LP 2 VORPLANUNG (LS 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Vorplanung Architekt | 58 at | Mi, 18.08.21 | Fr, 05.11.21 | Vorplanung Architekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Vorplanung Statik | 40 at | Mo, 13.09.21 | Fr, 05.11.21 | Vorplanung Statik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Vorplanung TGA | 40 at | Mo, 13.09.21 | Fr, 05.11.21 | Vorplanung TGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Abgabe Vorplanung final (ES-Bau) | 1 at | Mo, 08.11.21 | Mo, 08.11.21 | Abgabe Vorplanung final (ES-Bau) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Prüfzeit KGM | 5 at | Mo, 08.11.21 | Fr, 12.11.21 | Prüfzeit KGM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Freigabe Vorplanung KGM | 1 at | Fr, 12.11.21 | Fr, 12.11.21 | Freigabe Vorplanung KGM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Leistungsabruf LP3 | 1 at | Fr, 12.11.21 | Fr, 12.11.21 | Leistungsabruf LP3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | LP 3 ENTWURFSPLANUNG (LS 1) | 149 at | Mo, 15.11.21 | Do, 09.06.22 | LP 3 ENTWURFSPLANUNG (LS 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Entwurfsplanung Architekt | 70 at | Mo, 15.11.21 | Fr, 18.02.22 | Entwurfsplanung Architekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Entwurfsplanung Statik | 70 at | Mo, 15.11.21 | Fr, 18.02.22 | Entwurfsplanung Statik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Entwurfsplanung TGA, BS, Freianlagen | 70 at | Mo, 15.11.21 | Fr, 18.02.22 | Entwurfsplanung TGA, BS, Freianlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Finish und Abstimmung EW Bau | 10 at | Mo, 21.02.22 | Fr, 04.03.22 | Finish und Abstimmung EW Bau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Abgabe EW Bau final | 1 at | Fr, 04.03.22 | Fr, 04.03.22 | Abgabe EW Bau final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Durchlauf KGM | 10 at | Mo, 07.03.22 | Fr, 18.03.22 | Durchlauf KGM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | Ämterdurchlauf | 16 at | Mo, 28.03.22 | Mo, 18.04.22 | Ämterdurchlauf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | BOB | 1 at | Do, 21.04.22 | Do, 21.04.22 | BOB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | Oberbürgermeister | 1 at | Di, 26.04.22 | Di, 26.04.22 | Oberbürgermeister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10 | Betriebsausschuss KGM | 1 at | Di, 17.05.22 | Di, 17.05.22 | Betriebsausschuss KGM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.11 | Ausschuss Bildung, Schule und Sport | 1 at | Mi, 08.06.22 | Mi, 08.06.22 | Ausschuss Bildung, Schule und Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.12 | Jugendhilfeausschuss | 1 at | Do, 12.05.22 | Do, 12.05.22 | Jugendhilfeausschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13 | Finanzausschuss | 1 at | Mi, 18.05.22 | Mi, 18.05.22 | Finanzausschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.14 | Bauausschuss | 1 at | Do, 02.06.22 | Do, 02.06.22 | Bauausschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.15 | Stadtrat | 1 at | Do, 09.06.22 | Do, 09.06.22 | Stadtrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | LP 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG (LS2) | 209 at | Mo, 28.03.22 | Do, 12.01.23 | LP 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG (LS2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Freigabe Entwurfsplanung KGM | 1 at | Mo, 28.03.22 | Mo, 28.03.22 | Freigabe Entwurfsplanung KGM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Erteilung Auftrag LS 2 an Planer | 1 at | Mo, 28.03.22 | Mo, 28.03.22 | Erteilung Auftrag LS 2 an Planer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Hinweis: Zur Zeit der Erstellung der Genehmigungsunterlagen liegt noch kein Stadtratsbeschluss vor. Eventuelle Änderungen bedingen einen Änderungsaufwand, der in diesem TP nicht eingeplant ist. | 1 at | Mo, 28.03.22 | Mo, 28.03.22 | Hinweis: Zur Zeit der Erstellung der Genehmigungsunterlagen liegt noch kein Stadtratsbeschluss vor. Eventuelle Änderungen bedingen einen Änderungsaufwand, der in diesem TP nicht eingeplant ist. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Erstellung Bauantrag | 25 at | Mo, 09.05.22 | Fr, 10.06.22 | Erstellung Bauantrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Erstellung Genehmigungsstatik | 50 at | Mo, 04.04.22 | Fr, 10.06.22 | Erstellung Genehmigungsstatik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Abgabe Bauantrag | 1 at | Mo, 13.06.22 | Mo, 13.06.22 | Abgabe Bauantrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | Prüfzeit Bauordnungsamt | 152 at | Di, 14.06.22 | Mi, 11.01.23 | Prüfzeit Bauordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | Erteilung Baugenehmigung | 1 at | Do, 12.01.23 | Do, 12.01.23 | Erteilung Baugenehmigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | Erteilung Auftrag LS 3 an Planer | 1 at | Mo, 02.05.22 | Mo, 02.05.22 | Erteilung Auftrag LS 3 an Planer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projektterminplan LP 1-8 EWBau Neubau des Hortgebäudes der Grundschule Rothensee

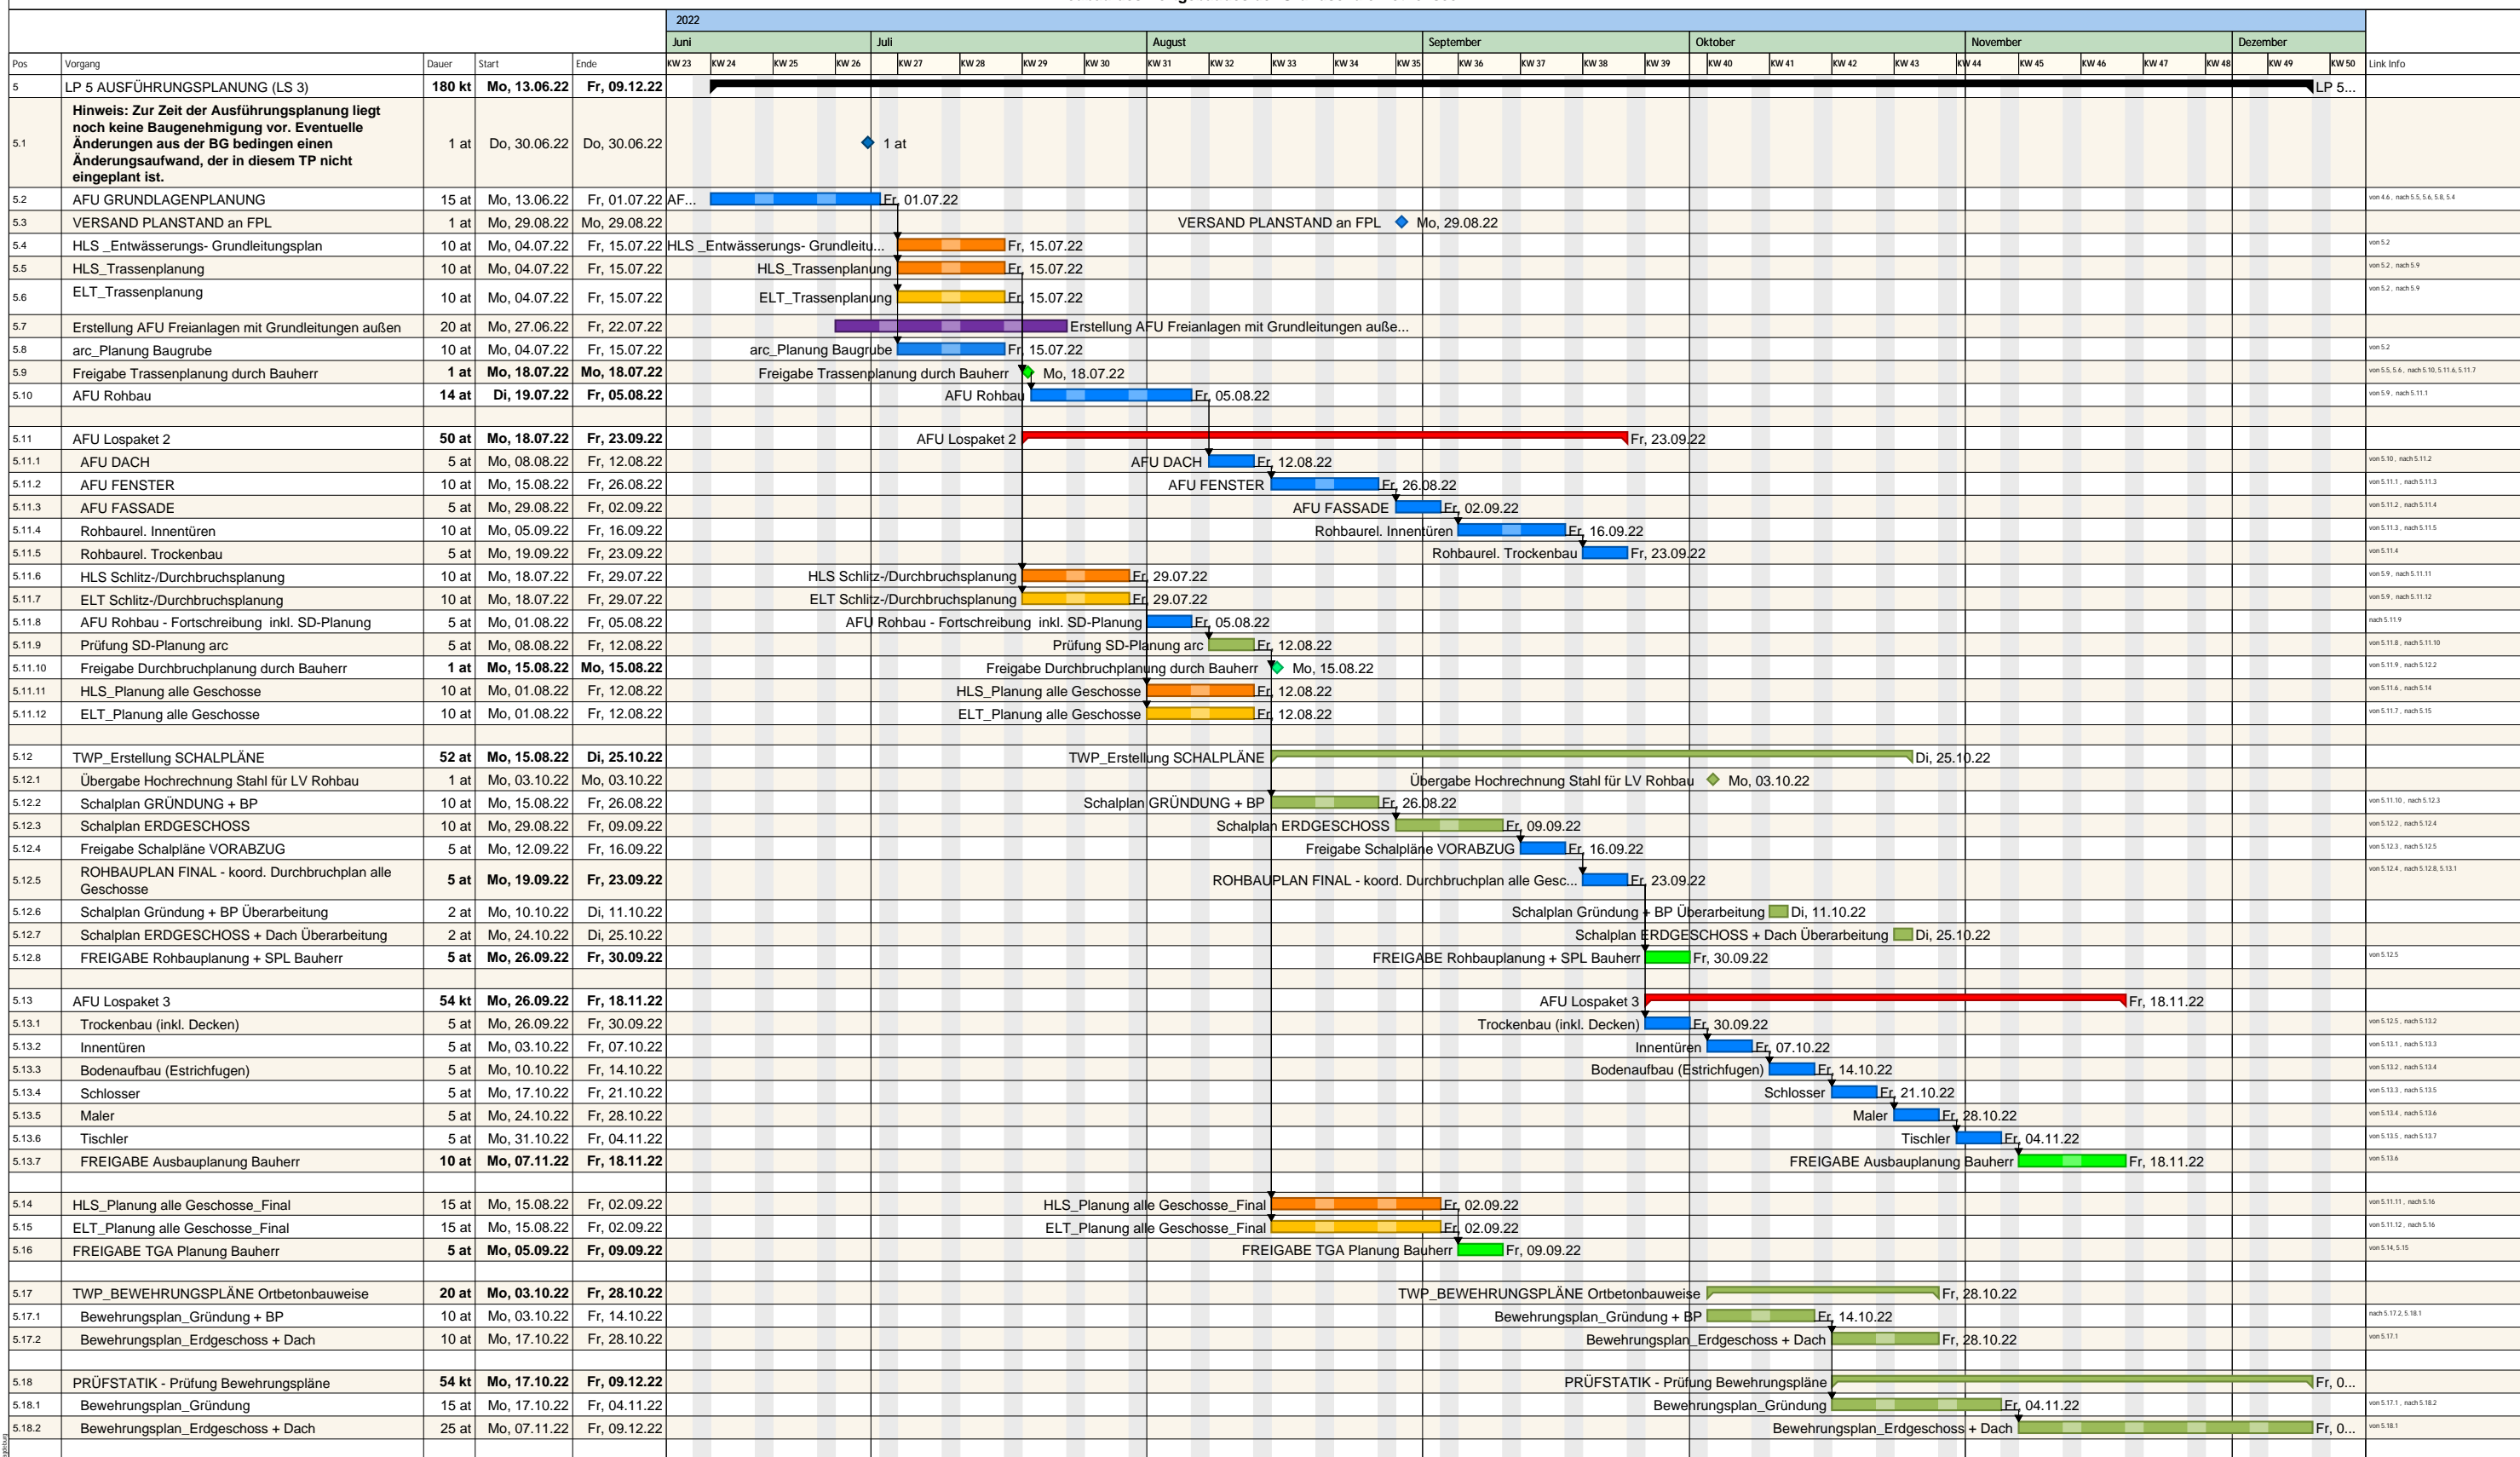

Projektterminplan LP 1-8 EWBau Neubau des Hortgebäudes der Grundschule Rothensee

| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | Link Info |
|--------|---|--------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|--------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | | Juli | | | | August | | | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Dezember | | | | Januar | | | Februar | | | März | | | April | | | |
| | | | | | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | |
| 6 | LP 6 VORBEREITUNG DER VERGABE (LS 3) | 137 at | Do, 21.07.22 | Fr, 27.01.23 | [Red bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LP 6 VORBEREITUNG DER VERGABE (LS 3) | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | LV Paket 1 | 27 at | Do, 21.07.22 | Fr, 26.08.22 | [Red bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Hinweis: Zur Zeit der öffentlichen Ausschreibung liegt noch keine Baugenehmigung vor! | 1 at | Do, 21.07.22 | Do, 21.07.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | LV Los BE | 5 at | Mo, 25.07.22 | Fr, 29.07.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3 | LV Los Gerüstbau | 5 at | Mo, 01.08.22 | Fr, 05.08.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4 | LV Los ROHBAU Hinweis: Aufgrund der vom BH gewünschten Terminkette erfolgt die Erstellung des Rohbau-LV's ohne vorliegende Schal- und Bewehrungspläne (Nachtragspotential!). | 15 at | Mo, 08.08.22 | Fr, 26.08.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.5 | LV Los Grundleitungen außerhalb Bodenplatte | 10 at | Mo, 25.07.22 | Fr, 05.08.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.6 | LV Los Grundleitungen unter Bodenplatte | 10 at | Mo, 25.07.22 | Fr, 05.08.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.7 | LV Los Blitzschutz- und Erdungsanlage | 10 at | Mo, 25.07.22 | Fr, 05.08.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | LV Paket 2 | 35 at | Mo, 29.08.22 | Fr, 14.10.22 | [Red bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | LV Los Dach | 10 at | Mo, 29.08.22 | Fr, 09.09.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2 | LV Los Fassade | 10 at | Mo, 12.09.22 | Fr, 23.09.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3 | LV Los Fenster Außentüren | 15 at | Mo, 26.09.22 | Fr, 14.10.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.4 | LV Los HLSK | 30 at | Mo, 29.08.22 | Fr, 07.10.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.5 | LV Los ELT | 30 at | Mo, 29.08.22 | Fr, 07.10.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | LV Paket 3 | 75 at | Mo, 17.10.22 | Fr, 27.01.23 | [Red bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | LV Los Innentüren | 10 at | Mo, 17.10.22 | Fr, 28.10.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2 | LV Los Innenputz | 10 at | Mo, 31.10.22 | Fr, 11.11.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.3 | LV Los Trockenbau | 15 at | Mo, 14.11.22 | Fr, 02.12.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.4 | LV Los Estrich | 10 at | Mo, 05.12.22 | Fr, 16.12.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.5 | LV Los Fliesen | 10 at | Mo, 19.12.22 | Fr, 30.12.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.6 | LV Los Bodenbelag und-beschichtung | 10 at | Mo, 02.01.23 | Fr, 13.01.23 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.7 | LV Los Maler | 10 at | Mo, 16.01.23 | Fr, 27.01.23 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | LP 7 MITWIRKUNG BEI DER VERGABE (LS 3) | 229 kt | Mo, 29.08.22 | Fr, 14.04.23 | [Red bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Vergabeverfahren LV Los Rohbau | 123 kt | Mo, 29.08.22 | Do, 29.12.22 | [Red bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Prüfung LV Leseexemplar BH | 10 at | Mo, 29.08.22 | Fr, 09.09.22 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Formblätter Einarbeitung Prüfbemerkungen | 5 at | Mo, 12.09.22 | Fr, 16.09.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3 | Veröffentlichung | 1 at | Fr, 16.09.22 | Fr, 16.09.22 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4 | Angebotsphase | 30 at | Fr, 16.09.22 | Do, 27.10.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5 | Submission | 1 at | Do, 27.10.22 | Do, 27.10.22 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.6 | Auswertung/ Vergabevermerk | 14 at | Fr, 28.10.22 | Mi, 16.11.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7 | Einspruchsfrist + Bearbeitung | 15 at | Do, 17.11.22 | Mi, 07.12.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.8 | Auftragserteilung | 1 at | Mi, 07.12.22 | Mi, 07.12.22 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.9 | Vorbereitung auf Baubeginn | 15 at | Do, 08.12.22 | Mi, 28.12.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.10 | möglicher Baubeginn | 1 at | Do, 29.12.22 | Do, 29.12.22 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Vergabeverfahren LV Los Fenster und Türen | 130 kt | Mo, 17.10.22 | Do, 23.02.23 | [Red bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Prüfung LV Leseexemplar BH | 10 at | Mo, 17.10.22 | Fr, 28.10.22 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2 | Formblätter Einarbeitung Prüfbemerkungen | 5 at | Mo, 31.10.22 | Fr, 04.11.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.3 | Veröffentlichung | 1 at | Fr, 04.11.22 | Fr, 04.11.22 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.4 | Angebotsphase | 30 at | Fr, 04.11.22 | Do, 15.12.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.5 | Submission | 1 at | Fr, 16.12.22 | Fr, 16.12.22 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.6 | Auswertung/ Vergabevermerk | 15 at | Fr, 16.12.22 | Do, 05.01.23 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.7 | Einspruchsfrist + Bearbeitung | 15 at | Fr, 06.01.23 | Do, 26.01.23 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.8 | Auftragserteilung | 1 at | Do, 26.01.23 | Do, 26.01.23 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.9 | Vorbereitung auf Baubeginn | 20 at | Fr, 27.01.23 | Do, 23.02.23 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.10 | möglicher Baubeginn | 1 at | Do, 23.02.23 | Do, 23.02.23 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Vergabeverfahren LV Los Trockenbau | 131 kt | Mo, 05.12.22 | Fr, 14.04.23 | [Red bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Prüfung LV Leseexemplar BH | 10 at | Mo, 05.12.22 | Fr, 16.12.22 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2 | Formblätter Einarbeitung Prüfbemerkungen | 5 at | Mo, 19.12.22 | Fr, 23.12.22 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3 | Veröffentlichung | 1 at | Mo, 26.12.22 | Mo, 26.12.22 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.4 | Angebotsphase | 30 at | Mo, 26.12.22 | Fr, 03.02.23 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.5 | Submission | 1 at | Mo, 06.02.23 | Mo, 06.02.23 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.6 | Auswertung/ Vergabevermerk | 15 at | Mo, 06.02.23 | Fr, 24.02.23 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.7 | Einspruchsfrist + Bearbeitung | 15 at | Mo, 27.02.23 | Fr, 17.03.23 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.8 | Auftragserteilung | 1 at | Fr, 17.03.23 | Fr, 17.03.23 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.9 | Vorbereitung auf Baubeginn | 20 at | Mo, 20.03.23 | Fr, 14.04.23 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.10 | möglicher Baubeginn | 1 at | Fr, 14.04.23 | Fr, 14.04.23 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Erteilung Auftrag LS 4 an Planer | 1 at | Mo, 03.10.22 | Mo, 03.10.22 | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projektzeiträumen von Mo, 01.10.18 bis So, 29.12.24
Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)
Druckdatum: 05.01.2022 11:13
Filter:

Verantwortungsbereich Bauherr
Gesamtprojektzeit
Leistungsphasen
Gutachter
Architekt
Tragwerksplaner
Fachplaner TGA
Leistungen alle Planer

arc architekturconcept GmbH
Zum Domfleschen 1
D-39104 Magdeburg
Tel.: +49 391 56 51 20
e-Mail: info@arc-architektur.de

Projektterminplan LP 1-8 EWBau Neubau des Hortgebäudes der Grundschule Rothensee

| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | Link Info | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------------|--------------|---|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | LP 8 BAUÜBERWACHUNG (LS 4) | 244 at | Mo, 16.01.23 | Do, 21.12.23 | LP 8 BAUÜBERWACHUNG (LS 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Baustelleneinrichtung | 10 at | Mo, 16.01.23 | Fr, 27.01.23 | Baustelleneinrichtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Erdarbeiten | 20 at | Mo, 16.01.23 | Fr, 10.02.23 | Erdarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 7.1.10, nach 9.3 |
| 9.3 | Rohbauarbeiten | 62 at | Mo, 13.02.23 | Di, 09.05.23 | Rohbauarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 4.8.9.2, nach 9.4, 9.5 |
| 9.4 | Fenster/Außentüren | 53 at | Mi, 10.05.23 | Fr, 21.07.23 | Fenster/Außentüren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.3 |
| 9.5 | Dachabdichtung / Dampfsperre 1. Lage (Dach dicht) | 20 at | Mi, 10.05.23 | Di, 06.06.23 | Dachabdichtung / Dampfsperre 1. Lage (Dach dicht) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.3, nach 9.9, 9.6, 9.8, 9.7 |
| 9.6 | Komplettierung Dachabdichtung | 35 at | Mi, 07.06.23 | Di, 25.07.23 | Komplettierung Dachabdichtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.5 |
| 9.7 | Fassade | 76 at | Mi, 07.06.23 | Mi, 20.09.23 | Fassade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.5 |
| 9.8 | TGA Rohinstalltionen | 60 at | Mi, 07.06.23 | Di, 29.08.23 | TGA Rohinstalltionen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.5, nach 9.10 |
| 9.9 | Ausbau | 86 at | Mi, 07.06.23 | Mi, 04.10.23 | Ausbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.5, nach 9.11 |
| 9.10 | TGA Feininstalltionen | 56 at | Mi, 30.08.23 | Mi, 15.11.23 | TGA Feininstalltionen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.8, nach 9.12 |
| 9.11 | Restarbeiten / Mängelbeseitigung | 30 at | Do, 05.10.23 | Mi, 15.11.23 | Restarbeiten / Mängelbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.9, nach 9.13, 9.14 |
| 9.12 | Inbetriebnahmen TGA | 12 at | Do, 16.11.23 | Fr, 01.12.23 | Inbetriebnahmen TGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.10 |
| 9.13 | Freianlagen | 69 at | Fr, 11.08.23 | Mi, 15.11.23 | Freianlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.11 |
| 9.14 | Zeitpuffer | 20 at | Do, 16.11.23 | Mi, 13.12.23 | Zeitpuffer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.11, nach 9.15 |
| 9.15 | Übergabe an Nutzer | 5 at | Do, 14.12.23 | Mi, 20.12.23 | Übergabe an Nutzer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.14, nach 9.16 |
| 9.16 | Hinweis: In der Bauzeit ist derzeit keine Zeit für eine witterungsbedingte Winterunterbrechung eingeplant. | 1 at | Do, 21.12.23 | Do, 21.12.23 | 1 at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.15 |
| 10 | Sommerferien 2024 | 31 at | Mo, 24.06.24 | Mo, 05.08.24 | Sommerferien 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Möglicher Nutzungsbeginn | 1 at | Do, 21.12.23 | Do, 21.12.23 | Möglicher Nutzungsbeginn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | von 9.15 |
