


Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	2009				2010				2011				2012	
					1. QII	2. QII	3. QII	4. QII	1. QII	2. QII	3. QII	4. QII	1. QII	2. QII	3. QII	4. QII	1. QII	
1	Erstellung der Vorplanung	78 Tage	Do 12.03.09	Mo 29.06.09														
2	Beantragung Fördermittel	180 Tage	Di 30.06.09	Mo 08.03.10														
3	Prüfung der Vorplanung und Erarbeitung der DS	8 Tage	Di 30.06.09	Do 09.07.09														
4	Bestätigung OB	1 Tag	Di 28.07.09	Di 28.07.09														
5	Bestätigung durch Betriebsausschuss KGm	1 Tag	Di 18.08.09	Di 18.08.09														
6	Ausschuss f. Stadientw., Bauen und Verkehr	1 Tag	Do 27.08.09	Do 27.08.09														
7	Bestätigung durch Betriebsausschuss Puppentheater	1 Tag	Fr 28.08.09	Fr 28.08.09														
8	Beschluss durch den F&G	1 Tag	Mi 26.08.09	Mi 26.08.09														
9	Erstellung der EW Bau	30 Tage	Do 27.08.09	Mi 07.10.09														
10	Prüfung im KGm und Erarbeitung DS (14Tg in A 13)	14 Tage	Do 08.10.09	Di 27.10.09														
11	Einreichung der EW-Bau beim F&G	95 Tage	Mi 28.10.09	Di 09.03.10														
12	Bestätigung OB	1 Tag	Mi 28.10.09	Mi 28.10.09														
13	Ausschuss f. Stadientw., Bauen und Verkehr	1 Tag	Do 19.11.09	Do 19.11.09														
14	Bestätigung durch Betriebsausschuss KGm	1 Tag	Di 01.12.09	Di 01.12.09														
15	Bestätigung durch Betriebsausschuss Puppentheater	1 Tag	Fr 13.11.09	Fr 13.11.09														
16	Bestätigung durch den F&G	1 Tag	Mi 18.11.09	Mi 18.11.09														
17	Stadtratsbeschluss i.V. Bewilligungsbescheid F&G	1 Tag	Do 03.12.09	Do 03.12.09														
18	Erstellung Genehmigungsplanung	21 Tage	Fr 04.12.09	Fr 01.01.10														
19	Ertelung der Baugenehmigung	65 Tage	Mo 04.01.10	Fr 02.04.10														
20	Erstellung der AFU und LV'e	45 Tage	Mo 05.04.10	Fr 04.06.10														
21	Prüfung der AFU und Bestätigung KGm	8 Tage	Mo 07.06.10	Mi 16.06.10														
22	Erstellung LV	14 Tage	Do 17.06.10	Di 06.07.10														
23	Ausschreibung	65 Tage	Mi 07.07.10	Di 05.10.10														
24	Realisierung	360 Tage	Mi 06.10.10	Di 21.02.12														

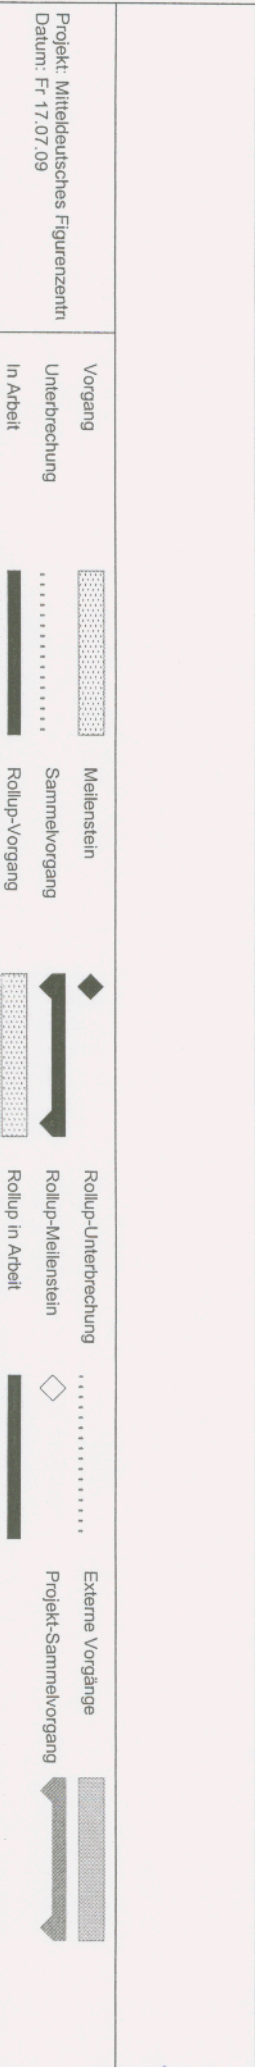

Vorgang
Unterbrechung
In Arbeit

Melienstein
Sammelvorgang
Rollup-Vorgang

Rollup-Unterbrechung
Rollup-Melienstein
Rollup in Arbeit

Externe Vorgänge
Projekt-Sammelvorgang

Projekt: Mitteldeutsches Figurenzentri
Datum: Fr 17.07.09

Anlage 2
