
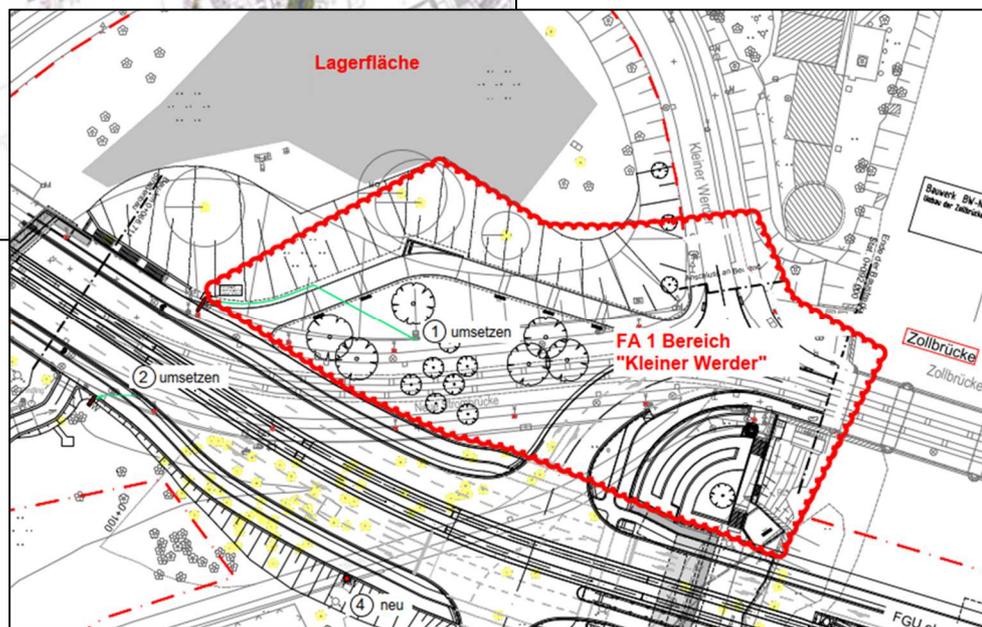




Bauvorhaben Ersatzneubau Strombrückenzug

Geplante Arbeiten in der Phase 5




Baubereich „Kleiner Werder“

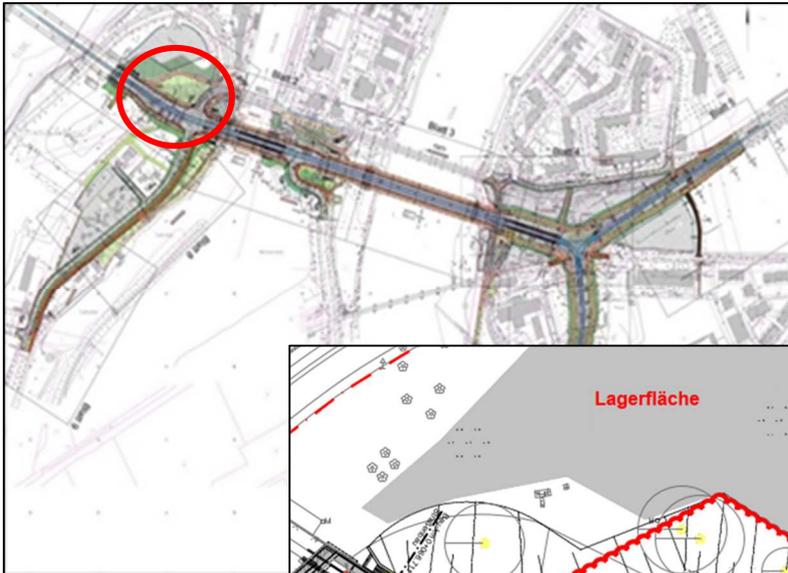



Maßnahmen AGM:

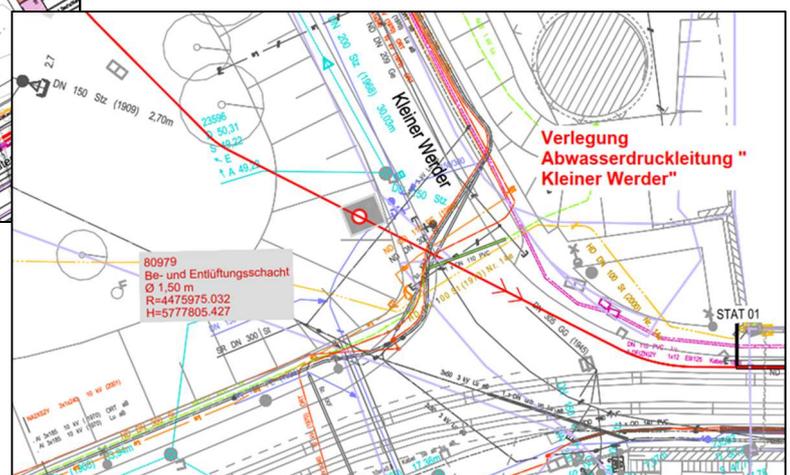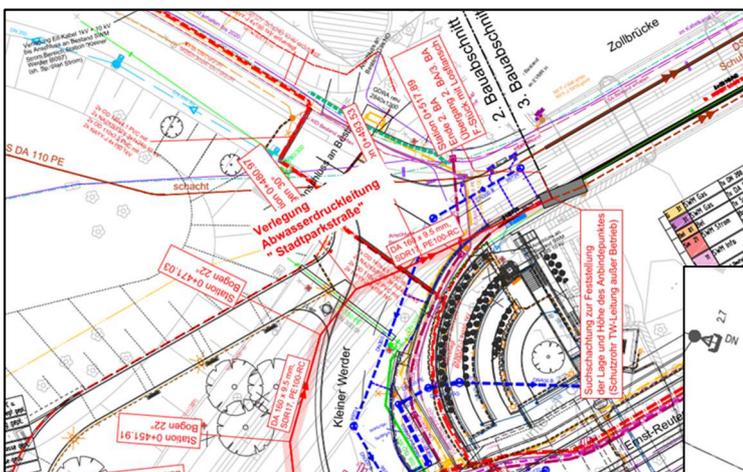


Maßnahmen SWM:

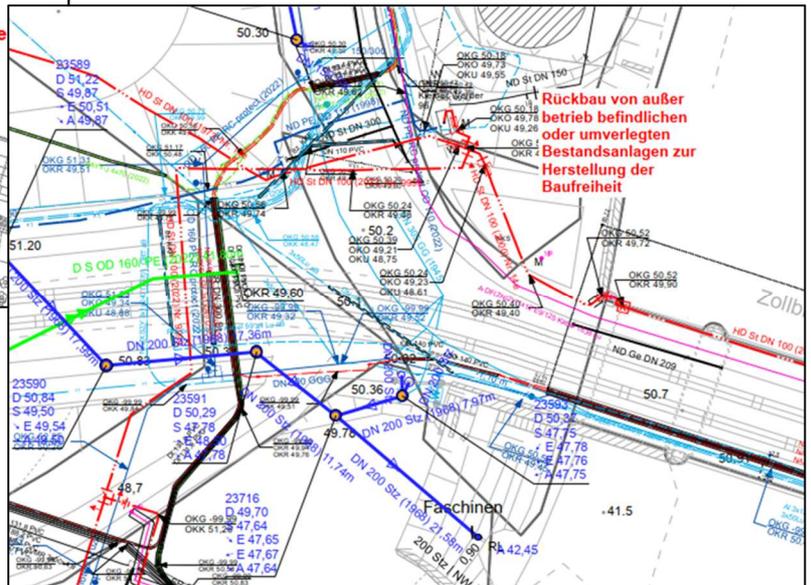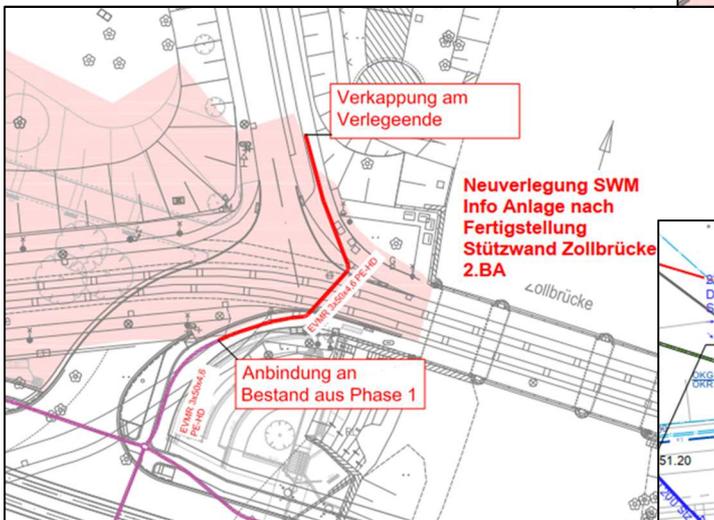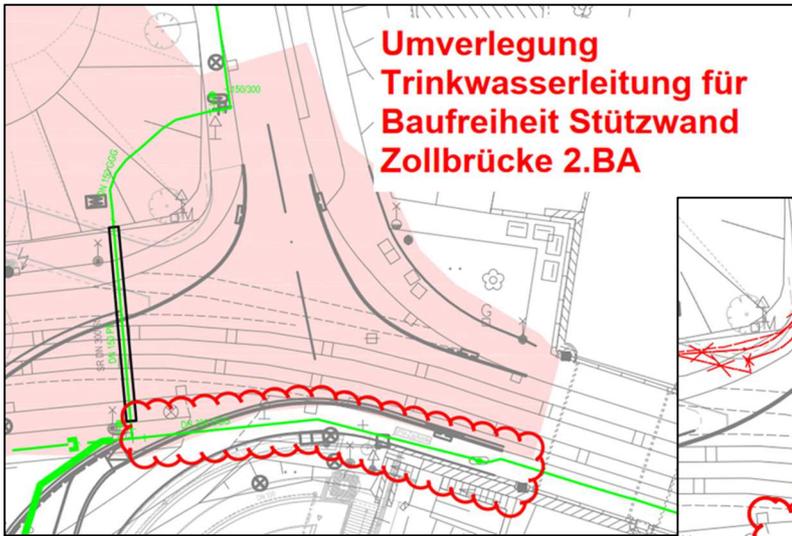


Maßnahmen der Landeshauptstadt Magdeburg

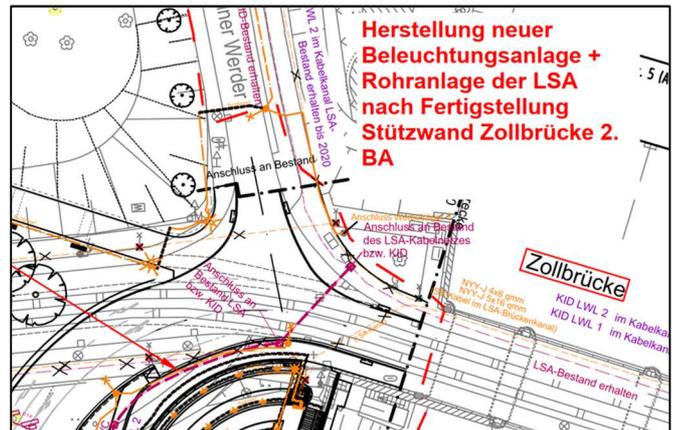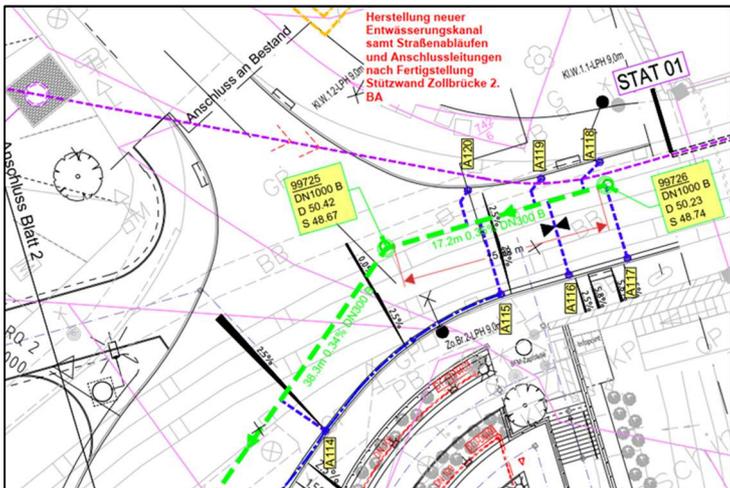

Maßnahmen Spezialtiefbau:

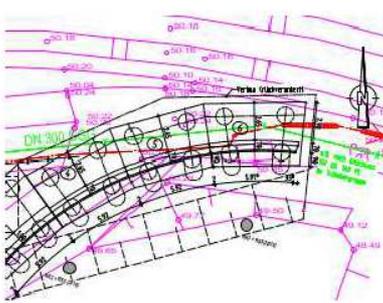

12 Großbohrpfähle
Durchmesser 1,2m,
Länge 10+5=15m

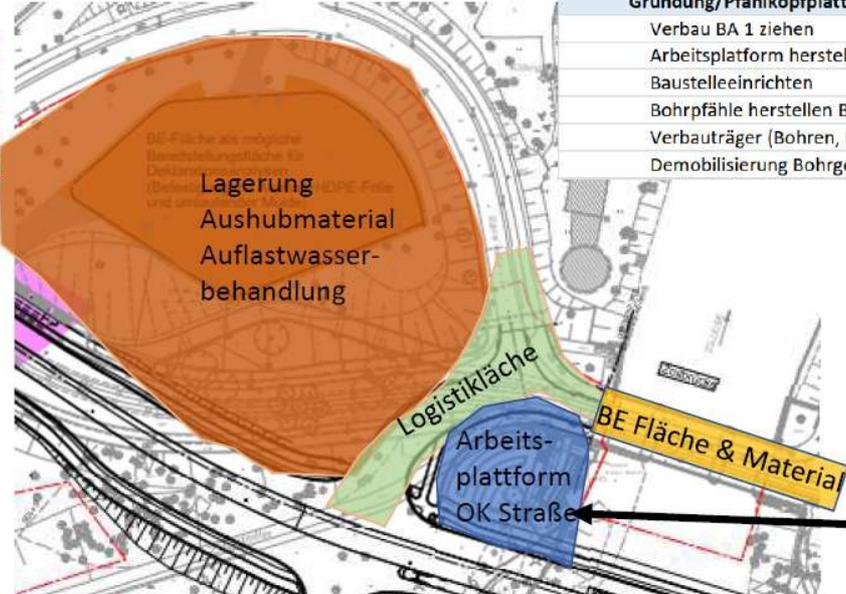

Lagerung
Aushubmaterial
Auflastwasser-
behandlung

Logistikfläche

Arbeits-
plattform
OK Straße

BE Fläche & Material

Gründung/Pfahlkopfplatte Block 4 - 6

- Verbau BA 1 ziehen
- Arbeitsplattform herstellen
- Baustelleeinrichten
- Bohrpfähle herstellen Block 4-6
- Verbauträger (Bohren, Einstellen, Vergießen)
- Demobilisierung Bohrerät




Maßnahmen Aushub und Ingenieurbau:

Stützwand Wand Block 4 - 6

- Aufgehende Stellschalung
- Bewehrung
- Schließschalung, Einbauteile und Betonagevorbereitung
- Beton
- Ausschalen
- Teilverfüllung

Bauphase 2 - Ausführung in Bauabschnitt BA VII

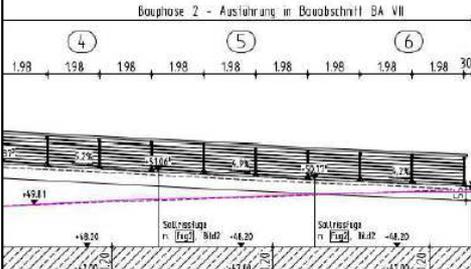



BE-Fläche,
Materiallager,
Schalung

Kran

Logistikfläche

Baugrube

Lagerung und Vorfertigung

Baugrube ausheben (gebösch, Trägerbohlverband Planum und Sauberkeitsschicht)

Pfahlköpfe herrichten

Pfahlkopfplatte Block 4 - 6

- Pfahlkopfplatte schalen
- Bewehrung
- Betonievorbereitung und Einbauteile
- Beton
- Ausschalen

Maßnahmen Ingenieurbau und Anschluss an Verkehrs- und Freianlage

Kopf Block 1-6

- Einschalen BA 1 (inkl. Vorbereitung Stellfläche, Gerüst)
- Bewehrung BA 1
- Beton BA 1
- Arbeitsfuge
- Einschalen BA 2 (inkl. Vorbereitung Stellfläche, Gerüst)
- Bewehrung BA 2
- Beton BA 2
- Ausschalen
- Restverfüllung

Beschichtungsarbeiten


- Oberflächenschutz Beschichtung Block 1-6 Gesims
- Antigriffitbeschichtung Stützwand

Ausstattung

- Geländer Vergabe und Herstellung
- Geländer Einbau

Terrassierte Rampe nördl. d. Zollbebrücke

- Setzen der FT-Stützelemente u. Borde
- Erdauffüllung, Drainage, Planum
- Setzen der Borde
- Herstellen Treppenanlage
- Ausstattung, Geländer, Beleuchtung
- Landschaftsbau + Wegebau
- Restarbeiten FA01, Abnahmen

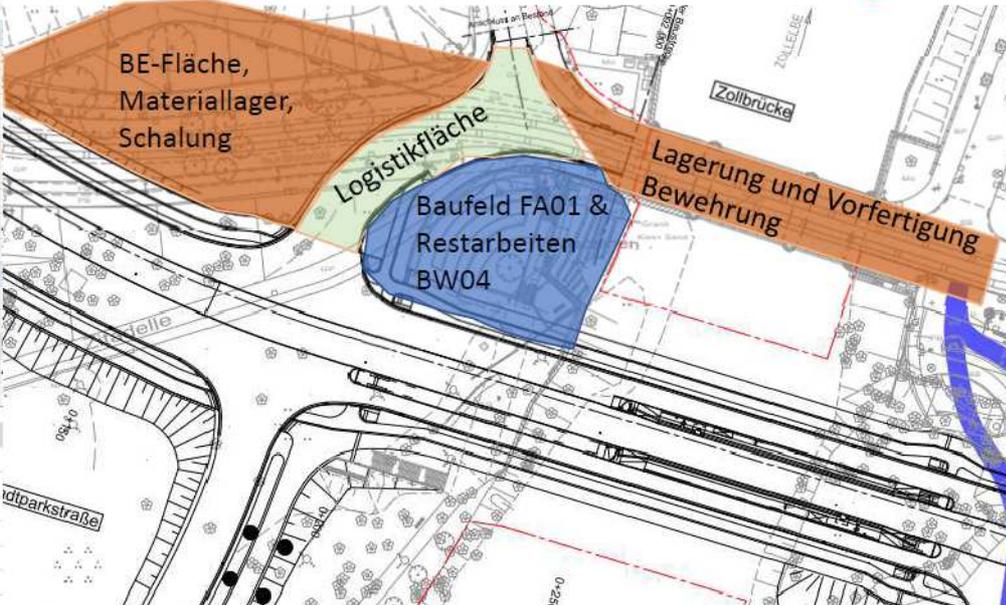

BE-Fläche,
Materiallager,
Schalung

Logistikfläche

Baufeld FA01 &
Restarbeiten
BW04

Lagerung und Vorfertigung

Zollbrücke

Zollstraße

Zollbrücke

Zollstraße

Verkehrsanlagen:

