

Magdeburg Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen

Kapelle / Kirche / Westturmgeschoss

Zugänglichkeit Krypta und Norbert-Grablege





Sarkophag in Altar integriert, Westkrypta / Norbertgrablege



Ausgrabungen, Westkrypta / Norbertgrablege




Treppe, Westkrypta / Norbertgrablege

Modell, Westkrypta /Norbertgrablege



Blick nach Westen auf die Norbertgrablege

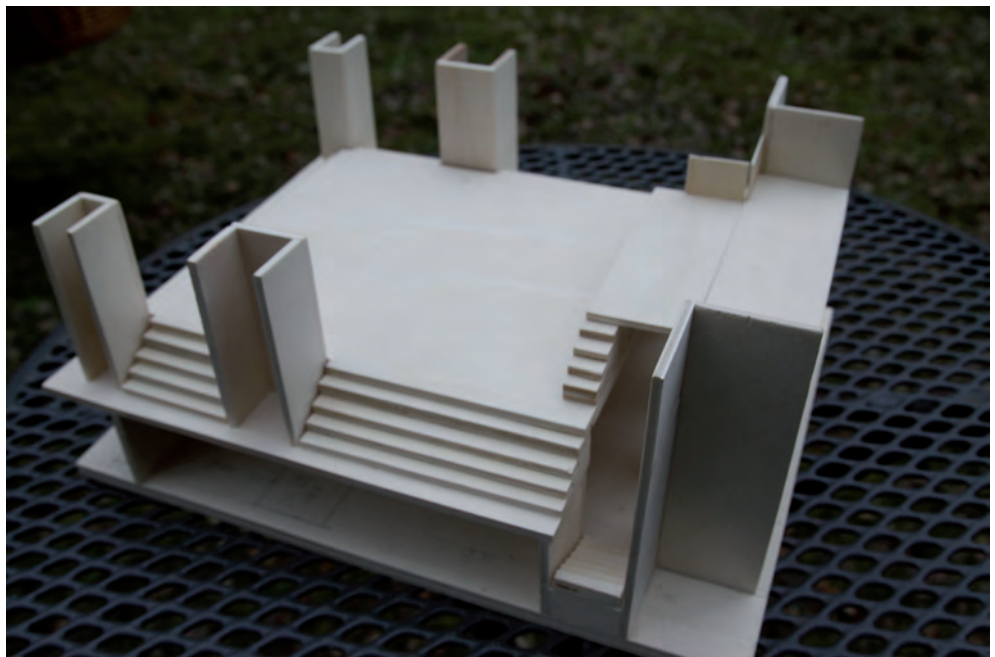

Blick auf die Vierung

Modell Hartkopf/Rüger

Bauablaufplan - Kunstmuseum Kloster ULF						Stand:		19.02.2017						
Konservierung / Restaurierung Krypta				2017										
		2016	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Ifd Nr	Titel													
	Planungszeiten im Vorlauf													
	städtische Ausschüsse													
	Einreichen Bauantrag bis Genehmigung													
	AFU und Ausschreibungen bis Auftragsvergabe													
	Realisierung - Aufstellung analog Änderungsantrag													
1.	Krypta													
1.1	Fußboden													
1.2	Wandflächen													
1.3	Natursteinarbeiten													
1.4	Gerüst - Sicherungsmaßnahmen													
1.5	bauliche Maßnahmen Klima - Westabschluss													
1.5.1	Verlegung Elektrokabel und Fußbodenheizung													
2.	Hochsäulige Kapelle													
2.1	Instandsetzung Wandflächen													
2.2	Natursteinarbeiten													
3.	Kirche - Westturmuntergeschoss													
3.1	Malerei im Bogen													
3.2	Wandflächen													



Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg		
Kostenschätzung nach DIN 276		
Nr.	Inhalt	Kostenstand vom 20.02.2017
1.	Krypta	
1.1	Fußbodenarbeiten einschließlich neuer Fußboden auf neuer Deckenebene, Stufenanlagen und notwendiger Geländer und Brüstungen	107.500,00 €
1.2	Instandsetzung Wandflächen	57.500,00 €
1.3	Natursteinarbeiten: Konservierung, Festigungen, Rissanierung Bauzier	8.000,00 €
1.4	Gerüstkosten einschl. Schutzmaßnahmen Staub im Kirchenraum und zur Orgel hin und Reinigung der Orgel nach Beendigung der Baumaßnahme zur Wiederherstellung des Vorzustandes	29.000,00 €
1.5	klimatische Maßnahmen Verbesserung des Raumklimas durch Reduzierung des Feuchteintrages und Verbesserung der Austrocknung in der Krypta inkl. Westabschluss Krypta zum Kirchenraum einschl. Abbrüche, Verlegung der Decke und Neuanlage der Treppen Im Zusammenhang mit Abbruch und Neubau Decke und Treppe:	236.000,00 €
1.5.1	aus Kostengruppe 400: Verlegung Elektrokabel und Fußbodenheizung	67.000,00 €
2.	Hochsäulige Kapelle	
2.1	Instandsetzung Wandflächen	4.000,00 €
2.2	Natursteinarbeiten: Konservierung, Festigungen, Rissanierung Bauzier	3.000,00 €
2.3	Gerüstkosten	1.000,00 €
3.	Kirche	
3.1	Konservierung und Restaurierung der Malerein im Bogen	6.000,00 €
3.2	Instandsetzung Wandflächen	4.000,00 €
3.3	Natursteinarbeiten: Konservierung, Festigungen, Rissanierung Bauzier Fußbodenreparatur	2.000,00 €
4.	Baunebenkosten darin enthalten:	
	Maßliche Bestandserfassung	32.000,00 €
	Baubefunduntersuchung Material und Klima	33.000,00 €
	Archäologische Befundklärung, Bauuntersuchung, einschl. Baubegleitung	32.000,00 €
	Restauratorische Voruntersuchung und Maßnahmekonzeption	5.000,00 €
	Planung Architekt	99.000,00 €
	zusätzlich: Tragwerksplanung und Fachplanung Elektro	70.000,00 €
	Baubegleitende Sicherheitskoordination und Gebühren aus Bauantrag	4.000,00 €
Zuwendungsfähige Gesamtausgaben		800.000,00 €
		
