TERMINPLAN
Planung und Realisierung

Anlage: 4

Bauvorhaben: **Neubau Gerätehaus FFW Olvenstedt**
Weizengrund, 39130 Magdeburg

KST: 1137 00000 **VKZ:** I 0911 37 002 **Objekt-Nr.:** 981.00 **Stand:** 1. Februar 2011

	Anfang	Ende
Erarbeitung Vorplanung	24.01.2011	04.02.2011
Drucksache Vorplanung	07.02.2011	11.02.2011
Oberbürgermeister		22.02.2011
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerang		10.03.2011
Betriebsausschuss Eb KGm		22.03.2011
Finanzausschuss		23.03.2011
Bauausschuss		24.03.2011
Erarbeitung EW-Bau	28.03.2011	08.04.2011
Drucksache EW-Bau	11.04.2011	29.04.2011
Oberbürgermeister		10.05.2011
Betriebsausschuss Eb KGm		24.05.2011
Ausschuss Umwelt / Energie		07.06.2011
Finanzausschuss		08.06.2011
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerang		09.06.2011
Bauausschuss		16.06.2011
Stadtrat Beschluss EW-Bau		23.06.2011
Genehmigungsplanung	27.06.2011	22.07.2011
Baugenehmigung	25.07.2011	21.10.2011
Ausführungsplanung, LV´s	24.10.2011	09.12.2011
Ausschreibung, Vergabe	21.11.2011	24.02.2012
Bauausführung	05.03.2012	18.01.2013
Übergabe / Inbetiebnahme	21.01.2013	04.02.2013
Gesamt		

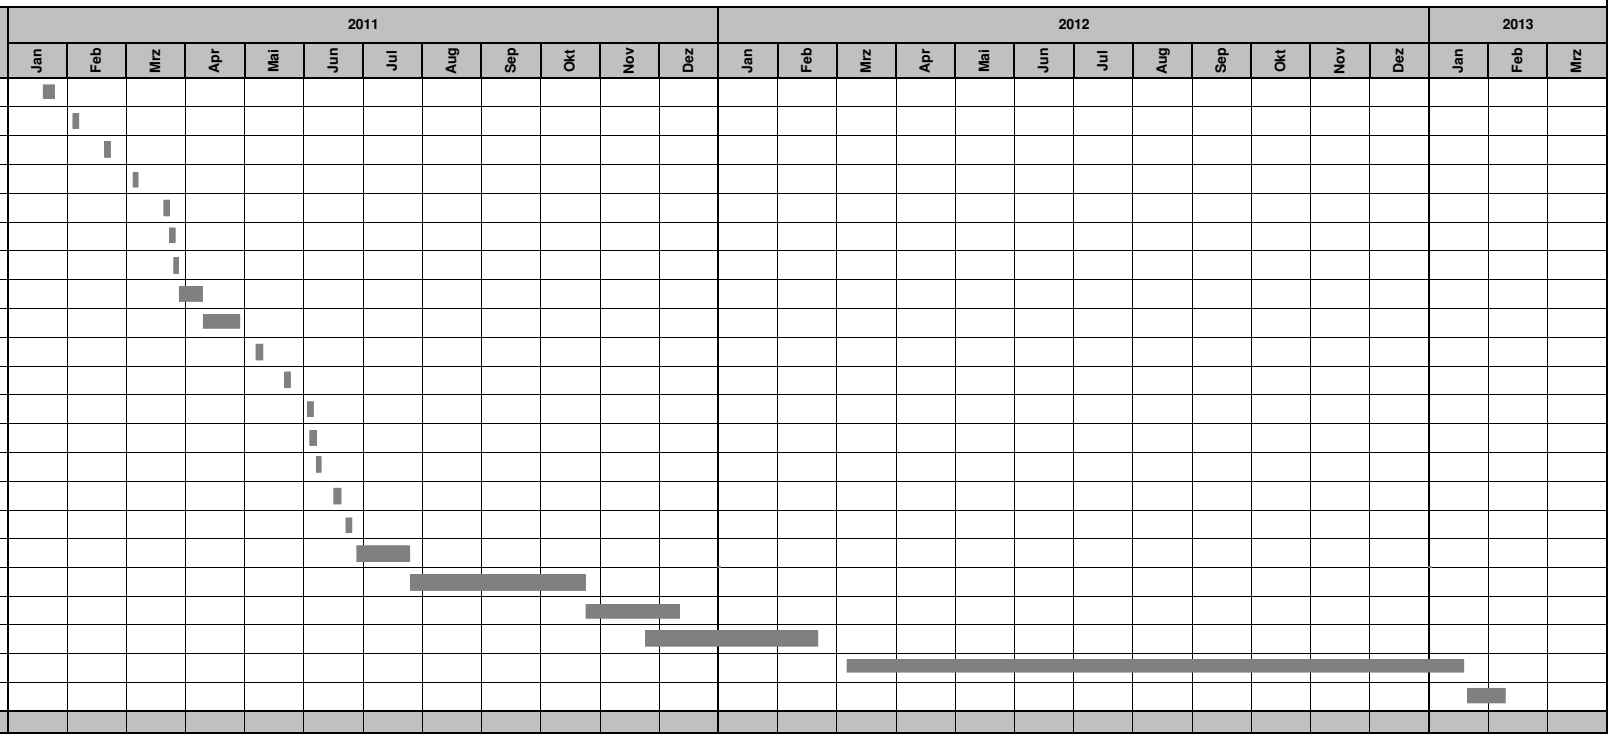

Bauherr: **Landeshauptstadt Magdeburg**
Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

Architekt / Ingenieur: Architekturbüro Peter Otto **Projektverantw.:** Fr. Scholz

Fachplaner

HLS: Borchert & Lunow **SB HLS:** Hr. Obst

Elektro: Ingenieurbüro HKM

Sondertechnik: **SB Elektro:** Hr. Walter

Freiflächen: Architekturbüro Peter Otto **SB Sondertechnik:** Hr. Walter

Tragwerk: Bautra GmbH

Mittelfristige Planung - Bedarf

Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtkosten	2009	2010	2011	2012	2013
2123 0100	0291 0002	190.400 €	80.000 €		110.400 €		
1137 0000	0961 1002	1.720.800 €	70.000 €			1.400.800 €	250.000 €
		69.300 €				69.300 €	
Gesamtkosten		**1.980.500 €**	**150.000 €**	**0 €**	**110.400 €**	**1.470.100 €**	**250.000 €**
Verplichtungsermächtigung		1.980.500 €			**1.720.100 €**		
