TERMINPLAN
Planung und Realisierung

Anlage 3

Bauvorhaben: **Ersatzneubau FFW Prester**
Alt Prester 67 a, 39114 Magdeburg

Proj.: ID: 998 **KST:** 1137 00000 **Investition-Nr.:** I 161137016 **Objekt-Nr.:** **Altbau:** 045.00 **Neubau:** 2160.00 **Stand:** 21. November 2017

	Anfang	Ende	Dauer
Grundsatzdrucksache DS 0143/16	16.06.2016	16.06.2016	0
Planerabfrage	27.06.2016	07.07.2016	10
Planungsbeginn	18.07.2016	18.07.2016	0
Erarbeitung Vorplanung	18.07.2016	10.09.2016	54
Abstimmung Vorplanung A 37 / FFW Pr	12.09.2016	29.12.2016	108
Überarbeitung Vorplanung	02.01.2017	16.01.2017	14
Erarbeitung DS Vorplanung	17.01.2017	16.03.2017	58
Fördermittelantrag Städtebau / Bescheid liegt noch nicht vor	**30.01.2017**	**02.08.2018**	549
Oberbürgermeister	28.03.2017	28.03.2017	0
Betriebsausschuss Eb KGm	18.04.2017	18.04.2017	0
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürg	19.04.2017	19.04.2017	0
Finanzausschuss	03.05.2017	03.05.2017	0
Bestätigung Vorplanung Ausschuss für Stadtentwicklung,	**11.05.2017**	**11.05.2017**	0
Erarbeitung EW-Bau	15.05.2017	04.09.2017	112
Erweiterung der Aufgabenstellung durch Amt 37	08.09.2017	08.09.2017	0
Entscheidung zur Anordnung der Garage	08.11.2017	08.11.2017	0
Überarbeitung EW-Bau	12.11.2017	24.11.2017	12
Drucksache EW-Bau / Überarbeitung BOB	04.09.2017	11.01.2018	129
Oberbürgermeister	16.01.2018	16.01.2018	0
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten	25.01.2018	25.01.2018	0
Betriebsausschuss Eb KGm	13.02.2018	13.02.2018	0
Finanzausschuss	14.02.2018	14.02.2018	
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	15.02.2018	15.02.2018	0
Stadtrat Beschluss EW-Bau	**22.02.2018**	**22.02.2018**	
Genehmigungsplanung	22.02.2018	05.04.2018	42
Baugenehmigung	05.04.2018	05.07.2018	91
Ausführungsplanung	05.07.2018	30.08.2018	56
Erstellung Leistungsverzeichnisse	02.08.2018	30.08.2018	28
Ausschreibung, Vergabe	30.08.2018	29.11.2018	91
Bauausführung	29.11.2018	29.11.2019	365
Übergabe / Inbetriebnahme	30.11.2019	14.12.2019	14
Gesamt			

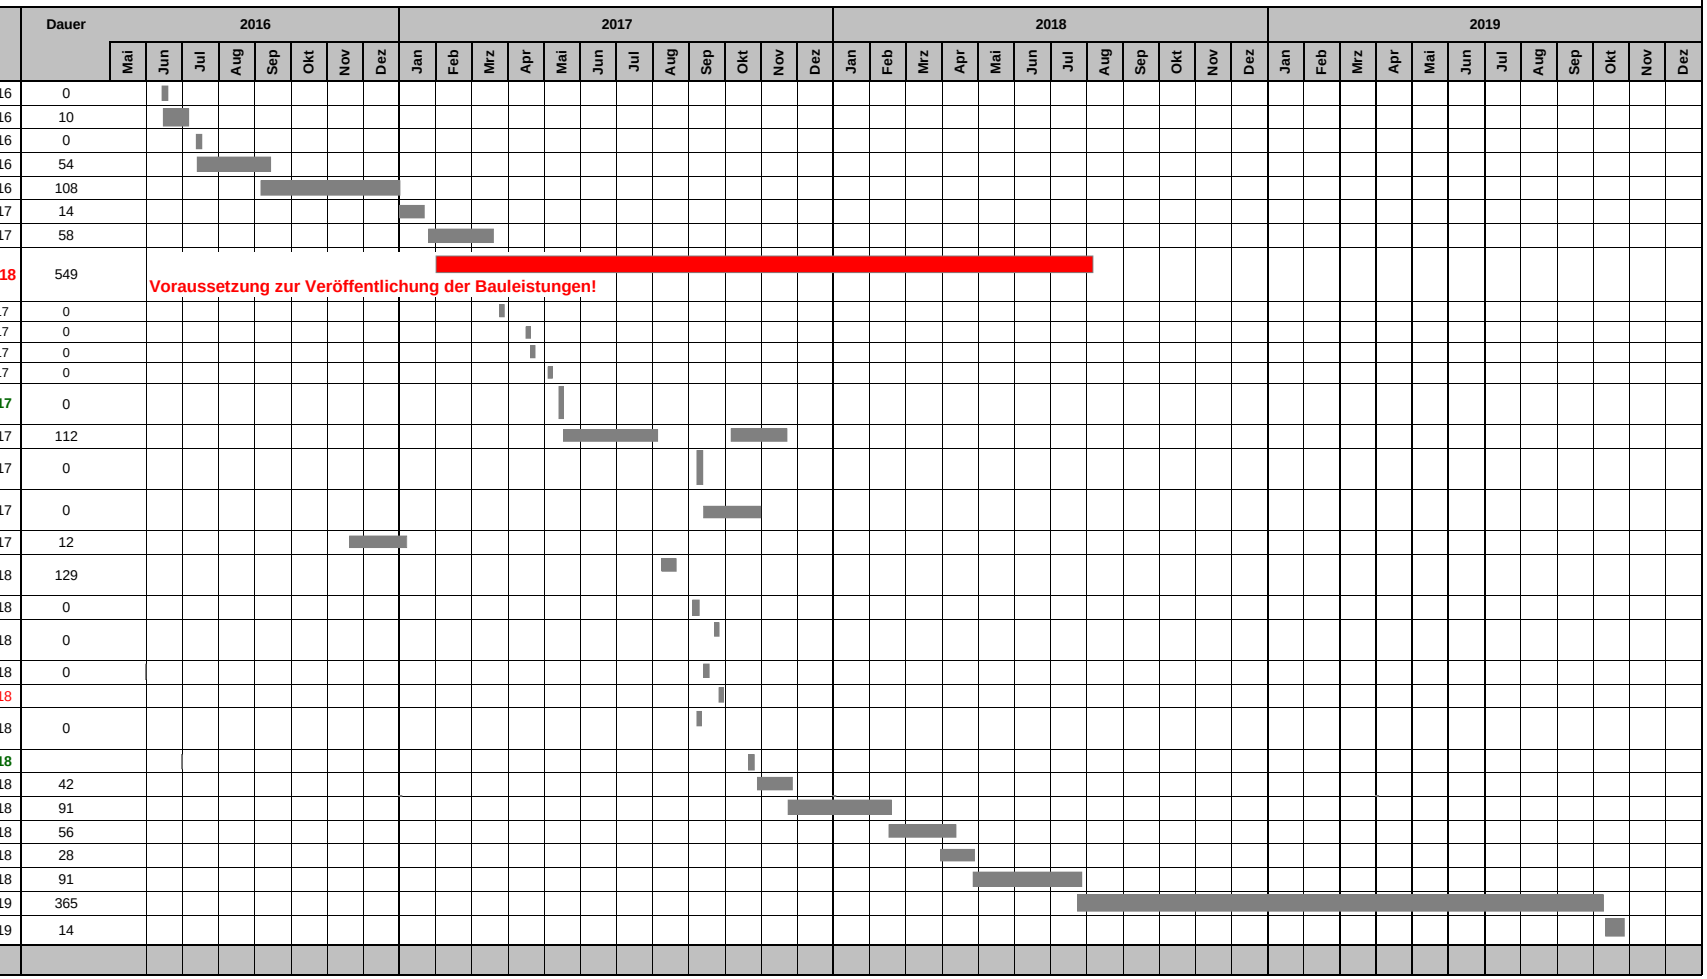

Mittelfristige Planung - Bedarf

Architekt / Ingenieur:	A.BB Architekten	**Projektleiter:**	Fr. Scholz
Tragwerk:	IB Ungewitter		
Bauphysik:	Reiwo Teuber		Grunderwerb
Brandschutz:	blaupause Dipl.-Ing. Schlesiger		Hochbaumaßnahmen
Freifläche:	Dipl.-Ing.- Strippentow		
HLS:	Ingenieurkontor N. Gerike	**SB HLS:**	Hr. Kirchgäßner
Elektro/Sondertechnik:	IB Hanusch	**SB Elektro:**	Hr. Hüniger

Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtkosten	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2123 0100	0291 0002	35.000 €				35.000 €			
11370000	0961 1002	1.845.000 €	1.392 €	58.608 €	50.000 €	180.000 €	975.000 €	500.000 €	80.000 €
Gesamtkosten		**1.880.000 €**	1.392 €	58.608 €	50.000 €	215.000 €	975.000 €	500.000 €	80.000 €
Verpflichtungsermächtigung		**580.000 €**					500.000 €	80.000 €	
