ANLAGE 8

Sanierung der Eskarpenmauer
EW - Bau

13.08.2018
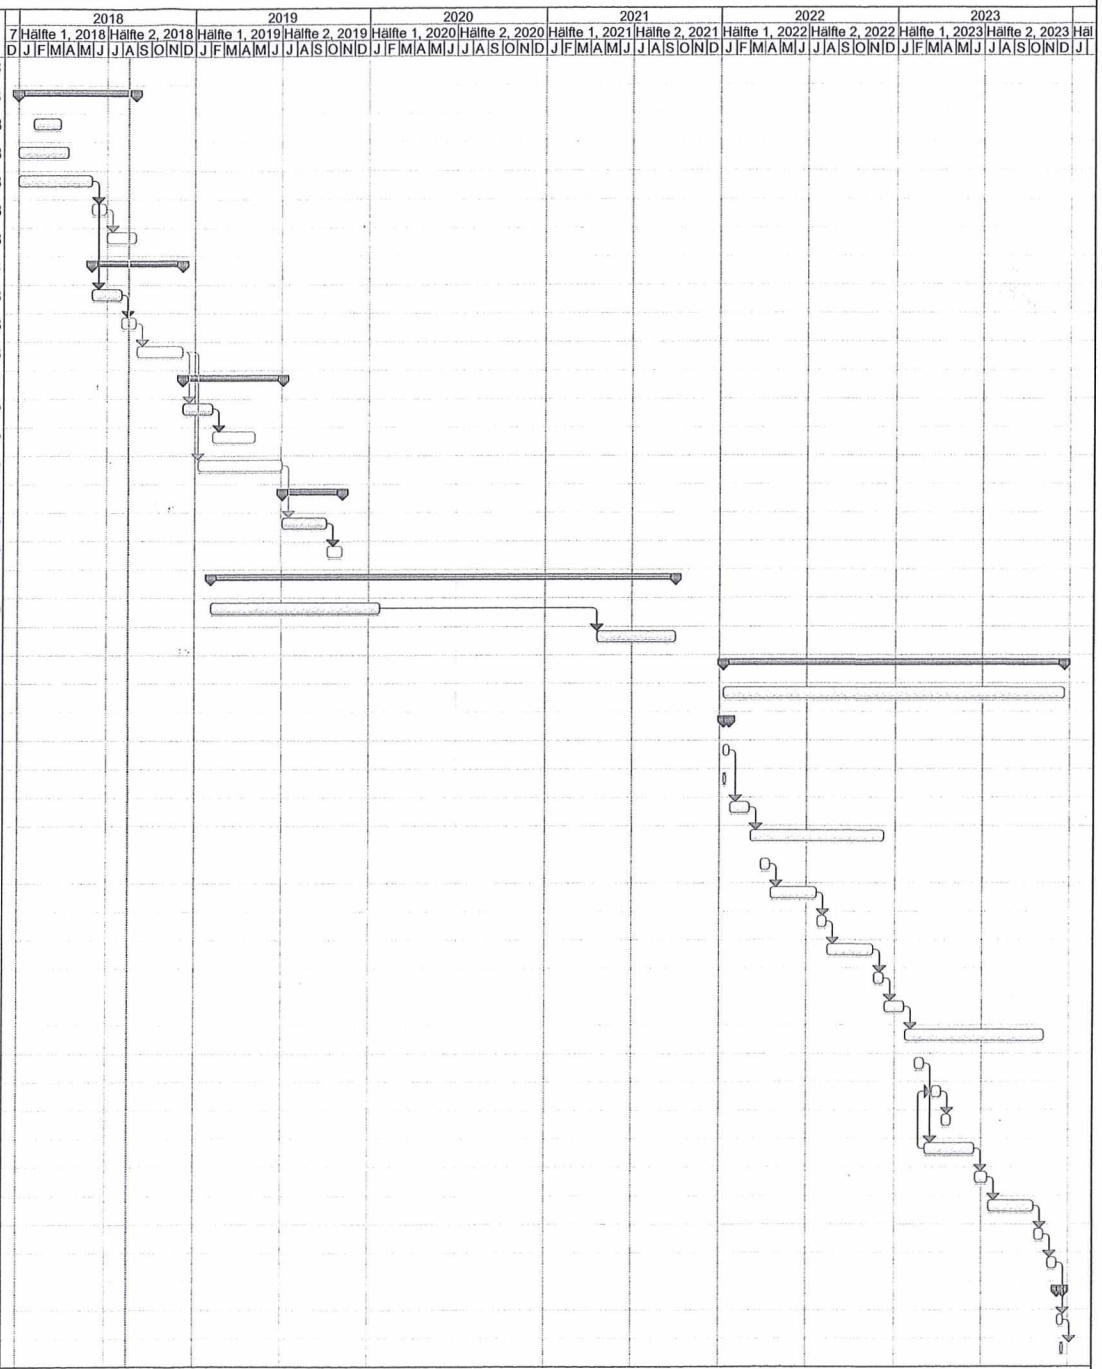
Nr.	Vorgangsname	lfd. Nr. Bericht EW-Bau (Pkt. 3.8.1)	Dauer	Anfang	Ende
1	**Sanierung der Eskarpenmauer BA 1**		**2223 Tage**	**Mo 03.01.05**	**Fr 12.07.13**
2	**Vorbereitung + Vorplanung**		**175 Tage**	**Mo 01.01.18**	**Fr 31.08.18**
3	Freischnitt, anschließend Vermessung		40 Tage	Do 01.02.18	Mi 28.03.18
4	Gutachten/Untersuchungen/Schadensaufnahme		75 Tage	Mo 01.01.18	Fr 13.04.18
5	Erarbeitung der Vorplanung		109 Tage	Mo 01.01.18	Do 31.05.18
6	ES-Bau, Prüfung KGm		21 Tage	Fr 01.06.18	Fr 29.06.18
7	BE, BA, FA		45 Tage	Mo 02.07.18	Fr 31.08.18
8	**Entwurfsplanung**		**135 Tage**	**Fr 01.06.18**	**Do 06.12.18**
9	Erarbeitung der Entwurfsplanung		43 Tage	Fr 01.06.18	Di 31.07.18
10	EW-Bau, Prüfung KGm		23 Tage	Mi 01.08.18	Fr 31.08.18
11	BE, BA, UA, FA, Stadtrat		69 Tage	Mo 03.09.18	Do 06.12.18
12	**Genehmigungsplanung**		**150 Tage**	**Fr 07.12.18**	**Do 04.07.19**
13	Erarbeitung der Genehmigungsplanung		44 Tage	Fr 07.12.18	Mi 06.02.19
14	Genehmigungsphase, Prüfung		63 Tage	Do 07.02.19	Mo 06.05.19
15	Prüfung BLSA		128 Tage	Di 08.01.19	Do 04.07.19
16	**Ausführungsplanung**		**89 Tage**	**Fr 05.07.19**	**Mi 06.11.19**
17	Erarbeitung der Ausführungsplanung		66 Tage	Fr 05.07.19	Fr 04.10.19
18	Prüfung KGm		23 Tage	Mo 07.10.19	Mi 06.11.19
19	**Ausschreibung / Vergabe**		**695 Tage**	**Mo 04.02.19**	**Fr 01.10.21**
20	Umweltverträglichkeitsprüfung		255 Tage	Mo 04.02.19	Fr 24.01.20
21	Ausschreibung + Vergabe		120 Tage	Mo 19.04.21	Fr 01.10.21
22	**Bauausführung**		**510 Tage**	**Mo 10.01.22**	**Fr 22.12.23**
23	Halbseitige Straßensperrung	1	510 Tage	Mo 10.01.22	Fr 22.12.23
24	**Bauvorbereitung (witterungsabhängig)**		**10 Tage**	**Mo 10.01.22**	**Fr 21.01.22**
25	Baustraße West	2	10 Tage	Mo 10.01.22	Fr 21.01.22
26	Anböschung Ost	4	5 Tage	Mo 10.01.22	Fr 14.01.22
27	Entschlammung BA 1.1 + 1.2	5	30 Tage	Mo 24.01.22	Fr 04.03.22
28	Wasserhaltung BA 1.1 + 1.2	6-7	200 Tage	Mo 07.03.22	Fr 09.12.22
29	Bau der Baustelleneinrichtung BA 1.1	8	15 Tage	Mo 28.03.22	Fr 15.04.22
30	Ausführung BA 1.1	9 - 23	70 Tage	Mo 18.04.22	Fr 22.07.22
31	Umsetzen der Baustelleneinrichtung BA 1.2	24 + 25	15 Tage	Mo 25.07.22	Fr 12.08.22
32	Ausführung BA 1.2	26 - 40	70 Tage	Mo 15.08.22	Fr 18.11.22
33	Rückbau der Verrohrung BA 1.1 + 1.2	41	15 Tage	Mo 21.11.22	Fr 09.12.22
34	Entschlammung BA 1.3 + 1.4 (witterungsabhängig)	42 - 43	30 Tage	Mo 12.12.22	Fr 20.01.23
35	Wasserhaltung BA 1.3 + 1.4	44 - 45	210 Tage	Mo 23.01.23	Fr 10.11.23
36	Baustelleneinrichtung BA 1.3	46	15 Tage	Mo 13.02.23	Fr 03.03.23
37	Profilierung BA 1.1 + 1.2	47	15 Tage	Mo 20.03.23	Fr 07.04.23
38	Rückbau der Baustraße BA 1.1 + 1.2	48	15 Tage	Mo 10.04.23	Fr 28.04.23
39	Ausführung BA 1.3	49 - 64	75 Tage	Mo 06.03.23	Fr 16.06.23
40	Umsetzen der Baustelleneinrichtung BA 1.4	65 - 66	20 Tage	Mo 19.06.23	Fr 14.07.23
41	Ausführung BA 1.4	67 - 83	70 Tage	Mo 17.07.23	Fr 20.10.23
42	Rückbau der Verrohrung BA 1.3 + 1.4	84	15 Tage	Mo 23.10.23	Fr 10.11.23
43	Profilierung BA 1.3 - 1.4 (witterungsabhängig)	85	15 Tage	Mo 20.11.23	Fr 08.12.23
44	**Baunachbereitung (witterungsabhängig)**		**10 Tage**	**Mo 11.12.23**	**Fr 22.12.23**
45	Rückbau Baustraße West	86	10 Tage	Mo 11.12.23	Fr 22.12.23
46	Reprofilierung Anböschung Ost	87	5 Tage	Mo 18.12.23	Fr 22.12.23
