VORLÄUFIGER TERMINPLAN - ***Fördermittel***

Bauvorhaben:

GS "Am Fliederhof"

Stand: Februar 2018
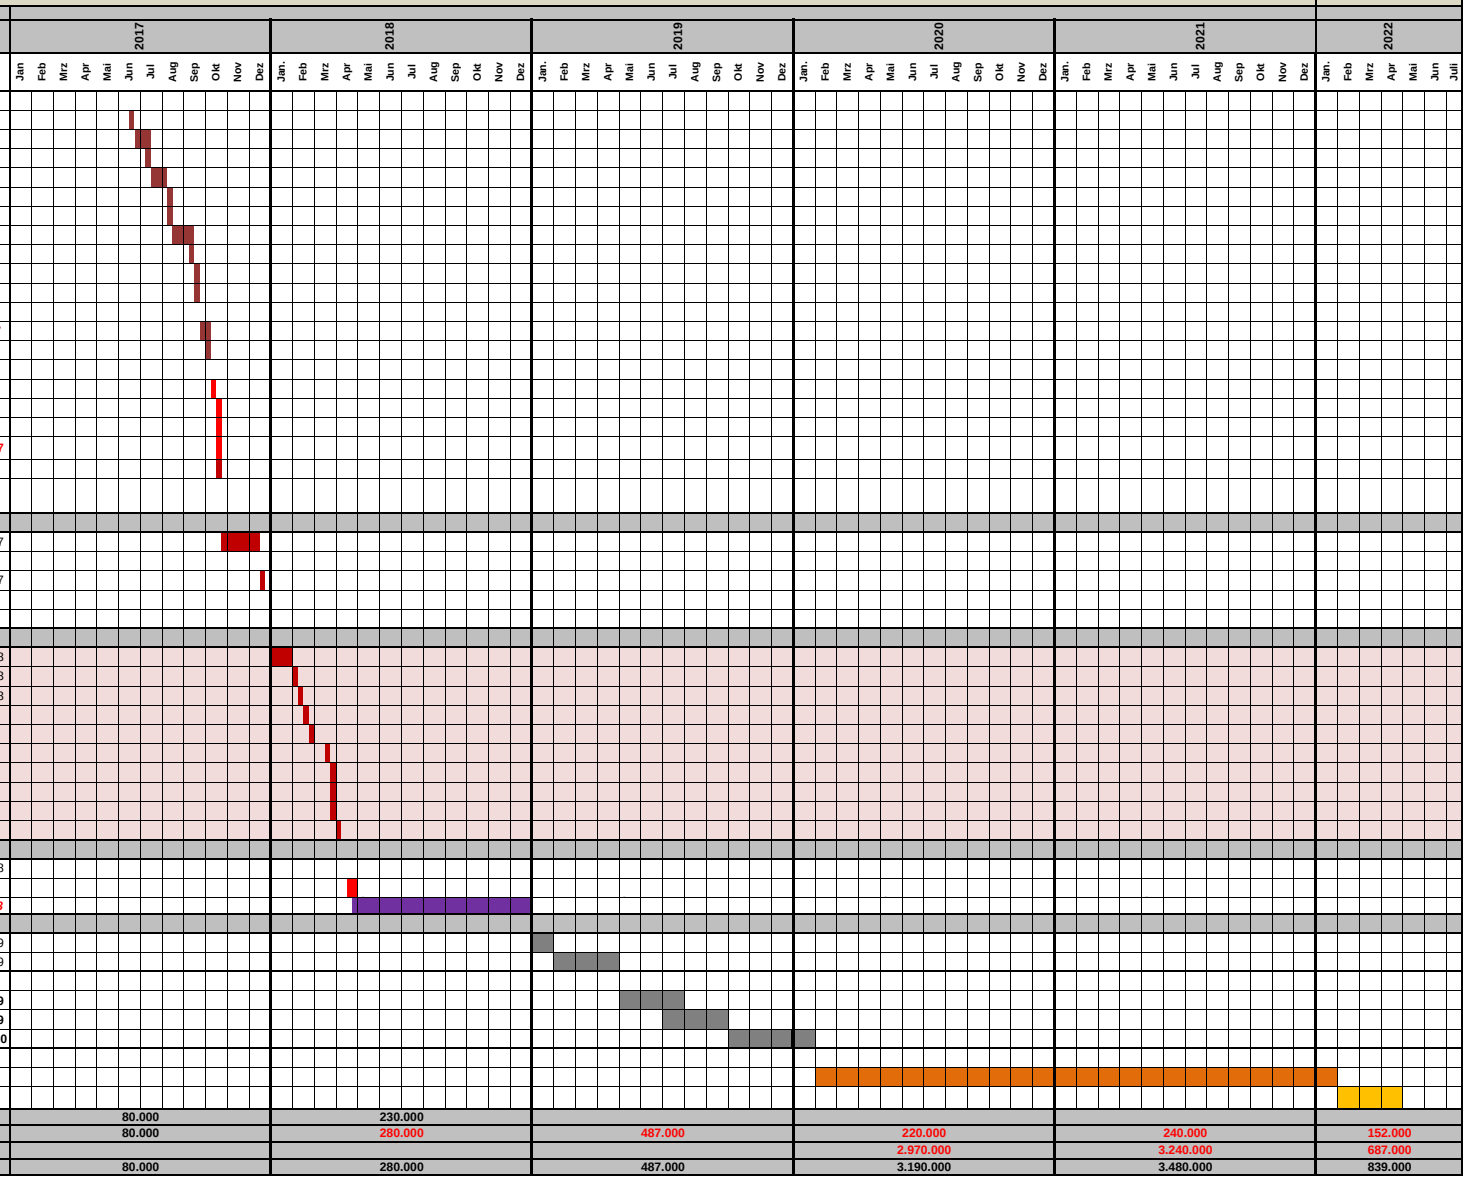
	Zeitraum
Bestätigung Raumprogramm	
Absendung Bekanntmachung/Elektronische Bekanntmachung	**17.06.2017**
30 Tage Zeitraum für Teilnahmeantrag	**18.07.2017**
Öffnung der Teilnahmeanträge	**18.07.2017**
vorläufige Auswertung der Teilnahmeanträge	**bis 07.08.2017**
Abschließende Auswertung Teilnahmeantrag	**bis 11.08.2017**
Versendung Vergabeunterlagen an max. 3 Bieter	**14.08.2017**
Zeitraum für Angebotseinholung	**30 Tg.**
Verhandlungsgespräche mit jeweils 3 Bietern	**bis 20.09.2017**
vorläufige Auswertung der Angebote	**bis 29.09.2017**
Vorbereitung Prüfung einer Vergabe	**29.09.2017**
FEIERTAGE	
Prüfung RPA	**6 Tg.-11.10.2017**
Erstellung Vergabe DS	**2 Tg.-09.-11.10.2017**
Ämterdurchlauf - entfällt	
Abgabe DS BOB	**1Tg-12.10.2017**
OB Sitzung	**17.10.2017**
Bestätigung Vergabevorschlag durch BA	**17.10.2017**
Absageschreiben an nicht berücksichtigte Bieter 10 Tage per Fax/Mail	**12.10.-23.10.2017**
Beauftragung der Planung	**24.10.2017**
Bekanntmachung über vergebenen Auftrag (max. 64Tage nach Auftragserteilung)	64 Tage
VORPLANUNG	
Erarbeitung Vorplanung (2 Mt)	24.10.-15.12.2017
Prüfung u. Bestätigung Vorpl. FB 40 (1 Woche)	18.12.-22.12.2017
ENTFÄLLT! Drucksache Vorplanung mit Ämterdurchlauf	*2 Wochen*
ENTFÄLLT! Bestätigung Vorplanung durch die Ausschüsse bis StVB	*10 Wochen*
EW-BAU	
Erarbeitung EW - Bau (1 Monate)	02.01.-31.01.2018
Prüfung u. Bestätigung EW-Bau FB 40 (1 Woche)	01.02.-07.02.2018
Drucksache EW - Bau und Mitzeichnung der Ämter	08.02.-21.02.2018
DS EW-Bau im Amt 13	**22.02.2018**
DS EW-Bau beim OB	**27.02.2018**
EW-Bau im Betriebsausschuss Eb KGm	**13.03.2018**
EW-Bau im Ausschuss Bildung Schule Sport	**20.03.2018**
EW-Bau im Finanzausschuss	**21.03.2018**
EW-Bau im StBV	**22.03.2018**
Bestätigung EW-Bau durch Stadtrat	**05.04.2018**
FÖRDERANTRAG	
Zusammenstellung Fördermittelantrag (1 Woche)	09.04.-16.04.2018
Einreichen des Förderantrages	**27.04.2018**
Prüfg Förderantrag/baufachliche Stellungn. -	***30.04.-31.12.2018***
GENEHMIGUNGSPLANUNG	
Erarbeitung Bauantrag (1 Mt.)	03.01.-31.01.2019
Prüfung BOA (3 Mt)	02.02.-30.04.2019
Ausführungsplanung und Vergabe	
Ausführungsplanung (3 Monate)	**02.05.-31.07.2019**
Erstellung LV (3 Mt)	**01.07.-30.09.2019**
Ausschreibung und Vergabe (ab 150.000 EUR BA) - 4 Mt	**01.10. - 30.01.2020**
Realisierung / Abrechnung / Projektdokumentation	
Realisierung	24 Monate
Abrechnung der Maßnahme	2 Monate
	1.459.000,00
KG 200 - 600 Summe in €	**6.897.000,00**
Gesamtsumme in €	**8.356.000,00**
