VORLÄUFIGER TERMINPLAN

**Bauvorhaben:** **Stadtarchiv, Mittagstraße 16** **Pro-Id: 964** **VKZ: I 104141011** **Objekt-Nr.:** 314.01 **Stand:** Jan. 2011
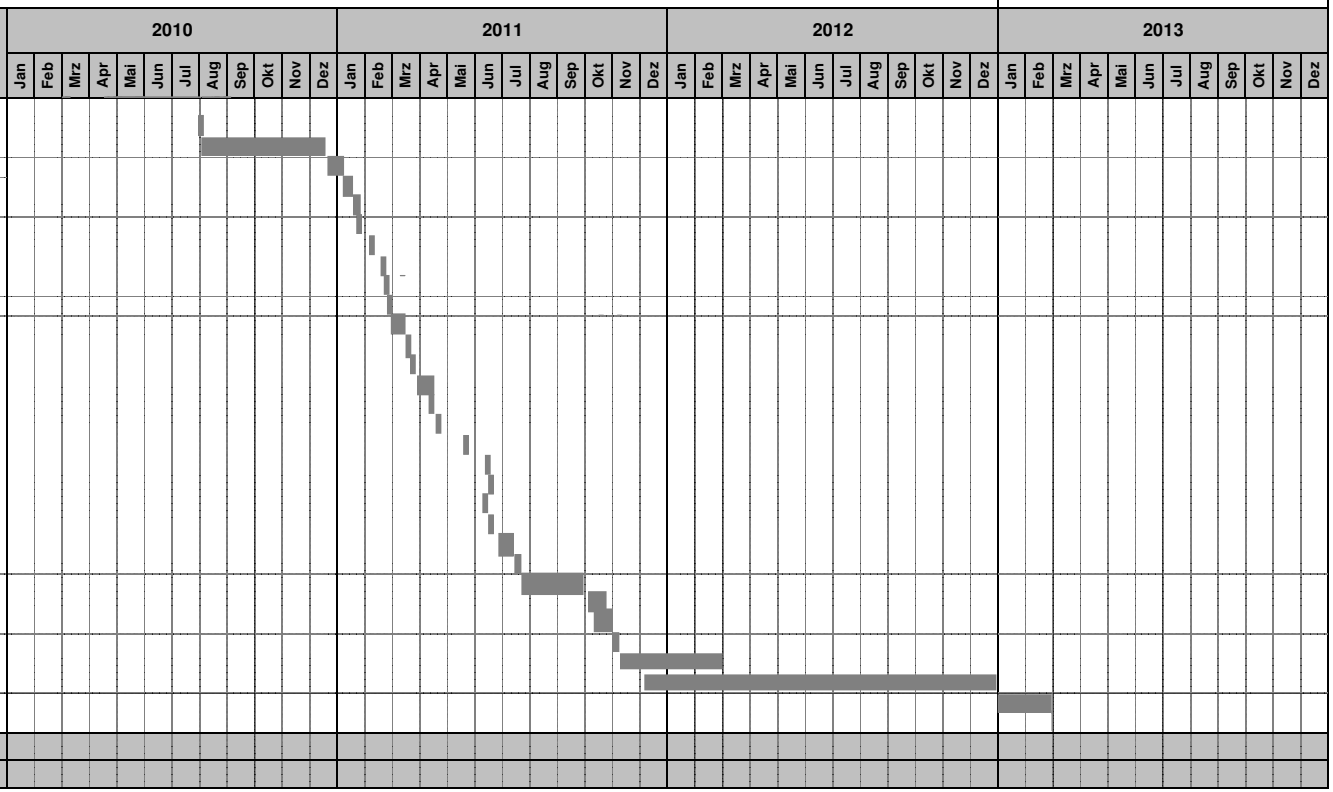
| | Anfang | Ende |
|---|---|---|
| **Beauftragung Vorplg.** | | 01.08.2010 |
| **Erstellung Vorplanung in versch. Varianten** | 01.08.2010 | 17.12.2010 |
| **Prüfung Vorpl. EB KGM** | 20.12.2010 | 07.01.2011 |
| **Prüfung Vorpl. FB 41** | 10.01.2011 | 14.01.2011 |
| **Drucksache Vorpl.** | 17.01.2011 | 27.01.2011 |
| **Amt 13** | | 27.01.2011 |
| **Oberbürgermeister** | | 08.02.2011 |
| **Betriebsausschuss** | | 22.02.2011 |
| **Finanzausschuss** | | 23.02.2011 |
| **Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr** | | 24.02.2011 |
| **Erstellung EW-Bau** | 28.02.2011 | 11.03.2011 |
| **Prüfung EW-Bau EB KGM** | 14.03.2011 | 18.03.2011 |
| **Prüfung EW-Bau FB 41** | 21.03.2011 | 25.03.2011 |
| **Drucksache HU-Bau** | 28.03.2011 | 21.04.2011 |
| **Amt 13** | | 21.04.2011 |
| **Oberbürgermeister** | | 26.04.2011 |
| **Betriebsausschuss** | | 24.05.2011 |
| **Kulturausschuss** | | 15.06.2011 |
| **Finanzausschuss** | | 22.06.2011 |
| **Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr** | | 16.06.2011 |
| **Stadtrat** | | 23.06.2011 |
| **Genehnemigungsplanung** | 27.06.2011 | 08.07.2011 |
| **Prüfung und Unterschrift EB KGM** | 11.07.2011 | 15.07.2011 |
| **Prüfung Amt 63** | 18.07.2011 | 30.09.2011 |
| **Ausführungsplanung** | 04.10.2011 | 21.10.2011 |
| **Vorbereiten der Vergabe** | 17.10.2011 | 28.10.2011 |
| **Prüfung der AFU/LV´s im EB KGM / Überarbtg.** | 01.11.2011 | 07.11.2011 |
| **Ausschreibung und Vergabe** | 08.11.2011 | 28.02.2012 |
| **Realisierung** | 01.12.2011 | 31.12.2012 |
| **Projektabrechnung/Projektdokumentation** | 02.01.2013 | 28.02.2013 |
