TERMINPLAN

Der Terminplan dient lediglich der Orientierung.

Bauvorhaben: **Umbau FFw Diesdorf, Alt Diesdorf 4, 39110 Magdeburg**

HHSt: 11370050 **Objekt-Nr.:** 043.00 **Stand:** 27.01.2017

	Anfang	Ende
Grundsatzbeschluss		**19.05.2016**
Erarbeitung DS Vorplanung	23.05.2016	03.06.2016
Ämterbeteiligung	06.06.216	17.06.2016
BOB Team Sitzungsmanagement		30.06.2016
Oberbürgermeister		05.07.2016
Betriebsausschuss KGm		16.08.2016
Ausschuss f. kommunale Rechts- u. Bürgerangeleg.		17.08.2016
Finanz- und Grundstücksausschuss		31.08.2016
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		**08.09.2016**
Entwurfsplanung bis EW-Bau	September 2016	Dezember 2016
Erarbeitung DS EW-Bau mit Ämterbeteiligung	Januar 2017	Februar 2017
BOB Team Sitzungsmanagement		02.03.2017
Oberbürgermeister		07.03.2017
Ausschuss f. kommunale Rechts- u. Bürgerangeleg.		15.03.2017
Betriebsausschuss KGm		21.03.2017
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		06.04.2017
Finanz- und Grundstücksausschuss		19.04.2017
Beschluss EW-Bau durch den Stadtrat		**20.04.2017**
Genehmigungsplanung		Mai 2017
Prüfung des Bauantrages durch das BOA	Juni 2017	August 2017
Ausführungsplanung	September 2017	Oktober 2017
Vorbereiten Vergabe / Anfertigung der LV's	Oktober 2017	November 2017
Mittelbewilligung durch Fördermittelgeber		
Ausschreibung und Vergabe	Dezember 2017	Februar 2018
Realisierung	**März 2018**	**Dezember 2018**

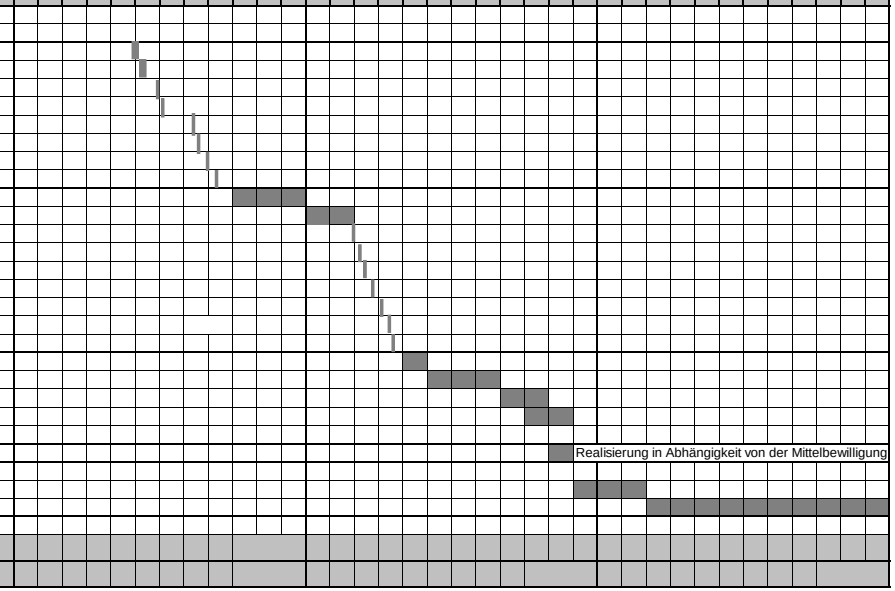

Bauherr:

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg

Projektleiter:	Herr Sußmann	s + s
Architekt:	Herr Sußmann	s + s
Fachplaner		
HLS:	Herr Kirste	IK Gerike
Elektro:	Herr Birth	iwb
Tragwerk:	Herr Gennrich	IKM

Projektgruppenleiter:	Frau Siebert
SB Planung:	Frau Siebert
SB HLS:	Herr Greuling
SB Elektro:	Herr Janek

Mittelfristige Planung

Sachkonto	Gesamtkosten	2013	2015	2016	2017	2018
	1.495.000	10.000	50.000	40.000	130.000	1.265.000

Sachkonto	zu beauftragen im laufenden HHJ			Kassenwirksamkeit			
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2019
		1.265.000				1.265.000	
Gesamt		1.265.000				1.265.000	

Anlage 6
